


# Portfólio de Projetos DGTEC 2022

*DGTEC - EsPro*



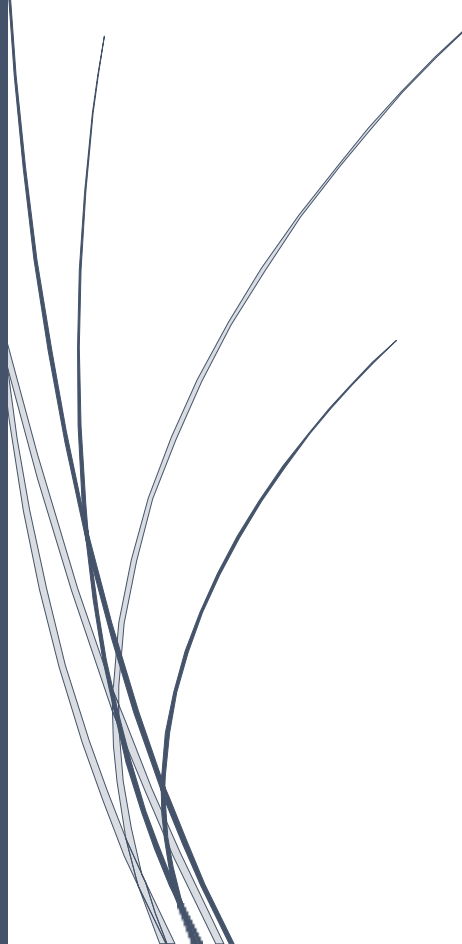

## Sumário


<b>1. Indicadores do Portfólio de Projetos EsPro .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Quantidade por classificação .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Quantidade por departamento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Quantidade por fase do projeto .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Quantidade por nível de acompanhamento .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5. Quantidade por situação .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6. Programas x Quantidade de Projetos .....</b>	<b>5</b>
<b>1.7. Evolução mensal dos projetos .....</b>	<b>6</b>
<b>1.8. Evolução do Portfólio .....</b>	<b>6</b>
<b>1.9. Legendas .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Portfólio EsPro .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Status atual dos projetos da GBTEC .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Status atual dos projetos do DEINF .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Status atual dos projetos do DEATE .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Status atual dos projetos do DESIS .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Status atual dos projetos da ASPJE .....</b>	<b>18</b>

# 1. Indicadores do Portfólio de Projetos EsPro

## 1.1. Quantidade por classificação




## 1.2. Quantidade por departamento

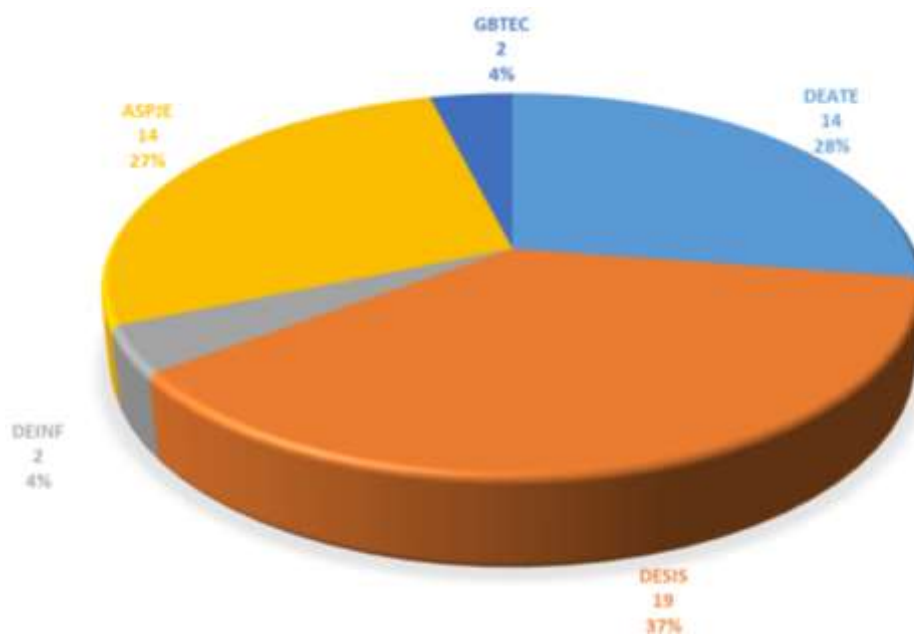


### 1.3. Quantidade por fase do projeto



### 1.4. Quantidade por nível de acompanhamento

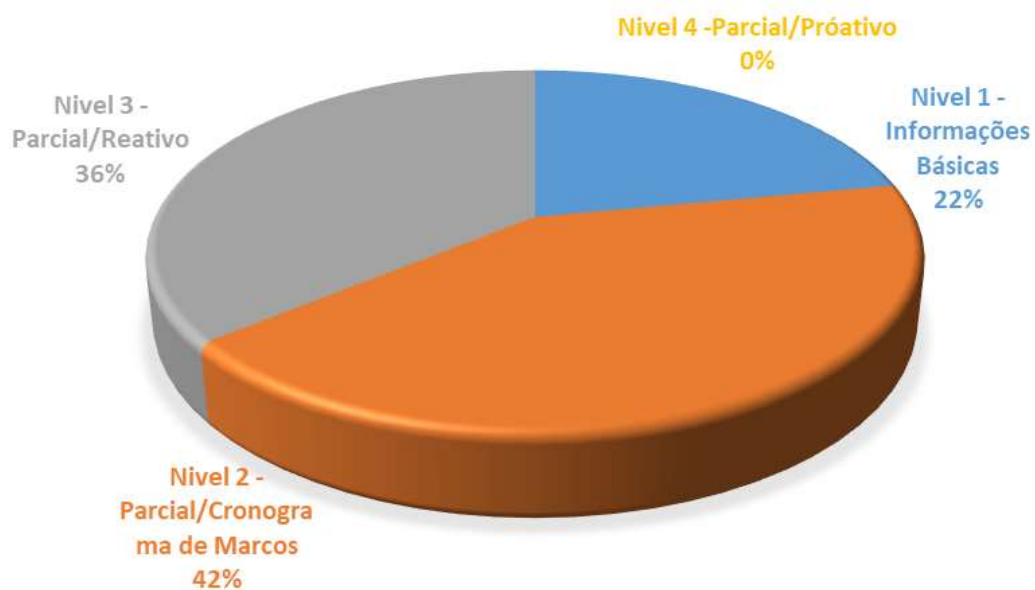


## 1.5. Quantidade por situação

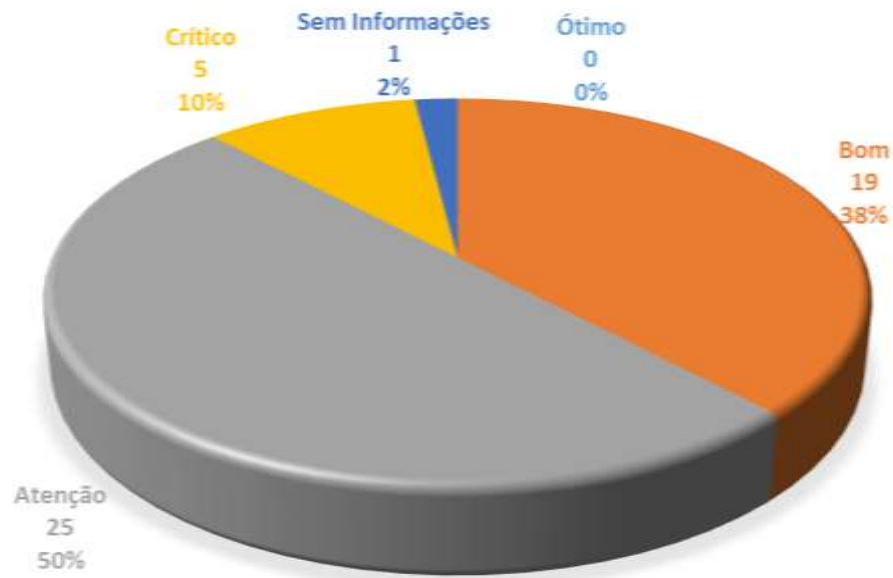


## 1.6. Programas x Quantidade de Projetos


### Programas X Quantidade projetos

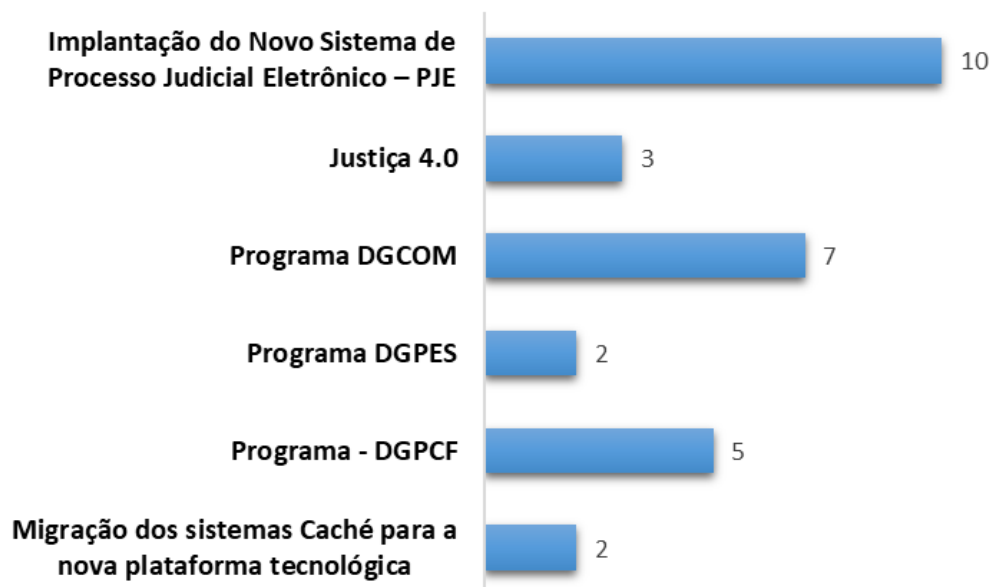

## 1.7. Evolução mensal dos projetos

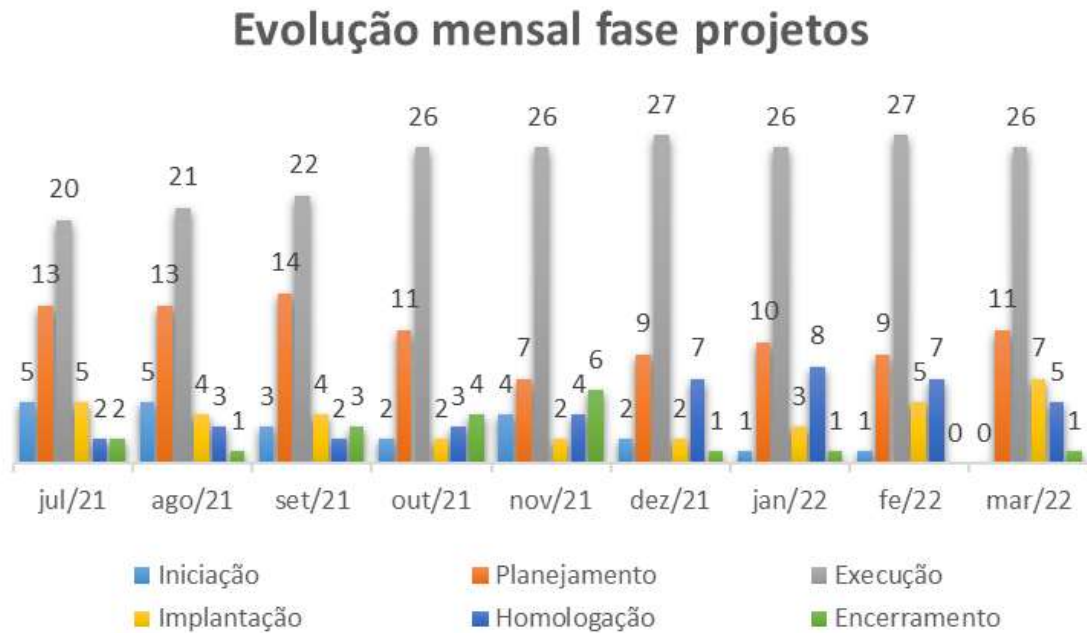

## 1.8. Evolução do Portfólio

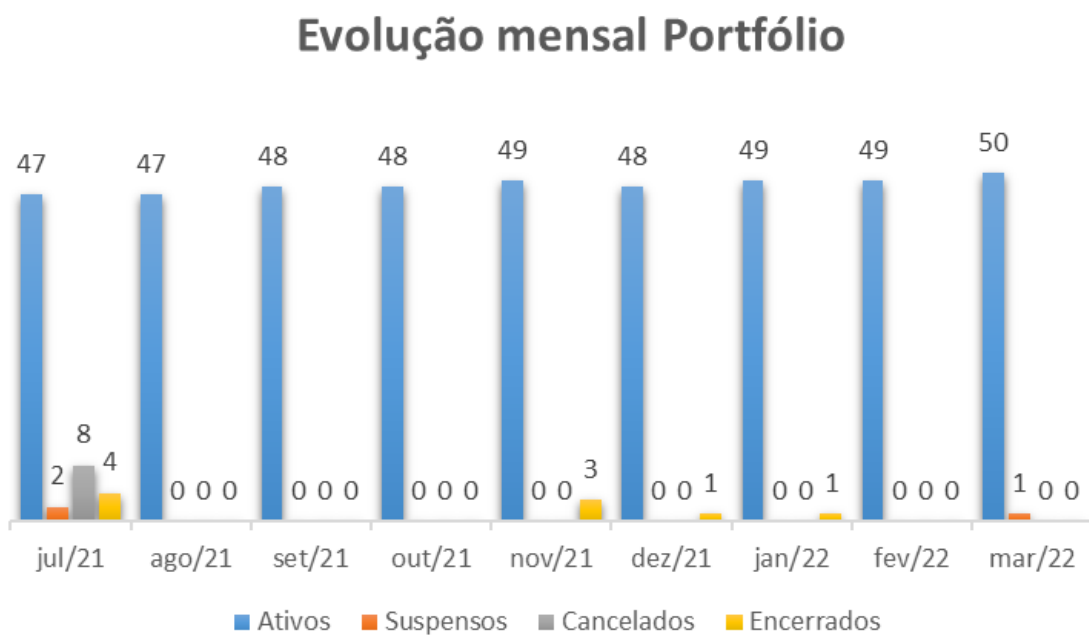

## 1.9. Legendas

<p><b>Estratégico (PE):</b> Classificação de Projeto que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução.</p>
<p><b>Prioritários (PP):</b> Classificação de Projeto que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pela Direção Geral da DGTEC.</p>
<p><b>Nível 1 - Informações Básicas:</b> Nível de Acompanhamento projeto onde ocorreu uma identificação de demandas com características de projeto, mas inexistente qualquer nível de acompanhamento pelo EsPro.</p>
<p><b>Nível 2 - Parcial/Cronograma de Marcos:</b> Nível de Acompanhamento projeto onde se possui de forma clara o escopo, acordo entre os envolvidos, inclusive com os fornecedores contratados, e existe um controle e monitoramento através de um cronograma a nível de marcos.</p>
<p><b>Nível 3 - Parcial/Reativo:</b> Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações reativas, ou seja, corrigir o rumo do projeto devido a problemas surgidos dentro da execução do planejamento do projeto.</p>
<p><b>Nível 4 - Pleno/Proativo:</b> Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações proativas, ou seja, antecipar possíveis problemas que venham a prejudicar o andamento da execução do planejamento do projeto.</p>
<p><b>Ótimo:</b> Projeto que possui situação ótima nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma.</p>
<p><b>Bom:</b> Projeto que possui boa situação nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma.</p>
<p><b>Atenção:</b> Projeto que possui alguma situação reportada como merecedora de atenção nos pontos Escopo, Contratação ou Cronograma.</p>
<p><b>Crítico:</b> Projeto que possui alguma situação reportada como crítica nos pontos Escopo, Contratação ou Cronograma.</p>
<p><b>Sem Informação:</b> Projeto que tem sua situação sem informação alguma reportada pelo GP ao ESPRO a respeito de Escopo, Contratação e Cronograma.</p>

## 2. Portfólio EsPro

Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Fim Previsto
Acessibilidade Portal	REQ2021.0144537/ SEI 20210660622 / SEI 20210668295(NAI)	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	JUL/21	ABR/22
App do GabineteWeb	REQ2021.0144670/ SEI 20180026366 / SEI 20190608552	Prioritário	Homologação	Flavio Vasquez Macieira	JAN/19	FEV/22
App Escritório Virtual	REQ2021.0144671/ SEI 20180219132/ SEI 20180227044	Prioritário	Implantação	Fernando Figueiredo	OUT/17	FEV/22
Assistente Virtual do Pje	REQ2021.0144651/ SEI 20210675202	Estratégico	Implantação	André do Amaral Gurgel	FEV/21	FEV/22
Atualização do Parque Tecnológico (continuação)	REQ2021.0144644/ SEI 20210620133	Estratégico	Execução	Abel Diniz de A Silva, Marcos Stallone, Paulo Cesar Soares Valle, Sidney Aloisio Pryor	JAN/21	DEZ/22
Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau (eJUD)	REQ2022.0047279/ SEI 20210674179	Prioritário	Planejamento	Moises Sardenberg da Rocha	OU/21	AGO/22
Certificação de Custas	REQ2021.0144663/ e-PROT 2016074804	Prioritário	Execução	Claudio da Costa Blanco	FEV/17	MAI/22
Cyber Segurança	REQ2021.0144645/ SEI 20210621520	Prioritário	Planejamento	Ivan Lindenberg Junior	JAN/21	ABR/22
Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos JEC e Juizados Fazendários	REQ2021.0144676/ e-PROT 20160050664	Prioritário	Execução	Paulo Henrique A da Silva e Gilberto de Souza Cardoso	AGO/17	JUN/22
Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI - (Implantação da Ferramenta Qlick) – fase 2	REQ2021.0143663/ SEI 20200684180 / SEI 20210632094	Prioritário	Planejamento	Luciano Ferreira Conill	OUT/14	JUN/22
Digitalização de processos físicos (continuação)	REQ2021.0143667/ SEI 20210640017	Estratégico	Execução	Flávia Luiza Salandra Lemos Adissi	FEV/21	DEZ/22
DNA WEB	REQ2021.0144673/ SEI 20200687459	Prioritário	Planejamento	Claudio Viana da Silva	OUT/16	TBD
e-Social	REQ2021.0143644/ e-PROT 20170200178	Prioritário	Execução	Victor de Alencar Jesus	FEV/17	JUN/22





Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Fim Previsto
Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC (continuação)	REQ2021.0143661/ SEI 20210638534 / SEI 20210625633 / SEI 20210634661	Estratégico	Execução	Renato Warwar	FEV/21	ABR/22
GabineteWeb	REQ2021.0144674/ SEI 20190608552/ SEI 20190601686	Prioritário	Implantação	Flavio Vasquez Macieira	NOV/17	MAR/22
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE – Competência Criminal	REQ2021.0143909/ SEI 20190600148	Estratégico	Execução	Alexandre José Costa de Araujo Góes	JUN/21	DEZ/22
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa	REQ2021.0144664/ SEI 20190600148	Estratégico	Execução	Rafael Santos Alves	ABR/21	OUT/22
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Cível	REQ2021.0144472/ SEI 20190600148	Estratégico	Implantação	Douglas Blanc	ABR/21	DEZ/22
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Infância e Juventude	REQ2021.0144646/ SEI 20190600148	Estratégico	Implantação	Humberto Vieira da Cruz	FEV/21	ABR/22
Implantação do RDC-Arq. no TJRJ	REQ2021.0226942/ SEI 20210656092	Prioritário	Planejamento	Marcelo Lettério dos Santos	DEZ/21	MAR/22
Implementação do novo sistema GPES	REQ2021.0144639/ e-PROT 2018197231	Prioritário	Execução	Victor de Alencar Jesus	JUN/15	TBD
Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4	REQ2021.0144483/ SEI 20200617042	Prioritário	Planejamento	Ivan Lindenberg Junior	SET/21	AGO/22
Integração com a PDPJ e o CODEX	REQ2022.0057961/ SEI20210688302	Estratégico	Planejamento	Natalie Mussi Tavares	MAR/22	JUL/22
Integração MNI 2.2.2 - STF	REQ2021.0143649	Prioritário	Homologação	Claudio A Félix Pinto	NOV/18	ABR/22
Integração MNI 3.0 - STJ	REQ2021.0143654	Prioritário	Execução	Claudio A Félix Pinto	MAI/21	TBD
Integração PJE x SEEU	REQ2021.0144445	Estratégico	Execução	André do Amaral Gurgel	JUL/21	DEZ/22
Justiça 4.0 - Datajud (Pje / Legado) - 2022	REQ2022.0005908/ SEI 20200689930	Estratégico	Execução	Marcelo Marçal	JAN/22	DEZ/22
Justiça 4.0 - Domicílio Eletrônico	REQ2021.0144655/ SEI 20200689930	Estratégico	Encerramento	Natalie Mussi Tavares	JUL/21	AGO/22



Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Fim Previsto
Justiça 4.0 - Painel de Usuário Externo (escritório virtual)	REQ2021.0144678/ SEI 20200689930	Estratégico	Execução	Natalie Mussi Tavares	JUL/21	AGO/22
Migração de dados DCP x Pje	REQ2021.0144647	Estratégico	Planejamento	André do Amaral Gurgel/ Alexandre Góes	JUL/21	TBD
Migração dos sistemas MUMPS da DIADM	REQ2021.0144452/ e-PROT 20160176222	Prioritário	Execução	Aline Viana Magalhães	FEV/16	DEZ/22
NatJus – Sistema SISNAT	REQ2021.0215561/ SEI 20210665713	Prioritário	Planejamento	Fernando Figueiredo	NOV/21	DEZ/22
Nome Social	REQ2021.0144681/ SEI 2020-0359995 / SEI 2019-0623230 / SEI 2019-0623239	Prioritário	Implantação	Fernando Figueiredo	JUL/18	JUN/22
Novo Portal Advogados/Partes	REQ2021.0144683/ e-PROT 20180227044	Encerramento	Implantação	Fernando Figueiredo	AGO/18	ABR/22
Novo Sigilo – 1ª Instância	REQ2021.0200328/ SEI 202106104606 / SEI 20210691877	Prioritário	Execução	Maria Eugênia de Castro Borges	NOV/21	MAI/22
Novo Sistema de Cálculos Judiciais	REQ2021.0144661/ SEI 20200645134 / SEI 20210616811	Prioritário	Execução	Marcelo Lettério dos Santos	OUT/20	DEZ/22
Novo Sistema de Cobrança	REQ2021.0144665/ PROT 2013035295	Prioritário	Execução	Claudio da Costa Blanco	DEZ/18	MAI/22
Novo Sistema de Controle de Usuários aos Sistemas Corporativos - Implantação do Novo Sistema de Gestão de Acesso (IDServerJus) – (continuação)	REQ2021.0144657	Estratégico	Execução	Paulo Henrique A da Silva	JAN/19	ABR/22
Novos Portais Corporativos em Desenvolvimento	REQ2021.0144521	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	FEV/21	DEZ/22
Parcelamento da GRERJ - Edital	REQ2022.0005900/ SEI 20210675699	Prioritário	Planejamento	Marcelo Lettério dos Santos	JAN/22	DEZ/22
Portal do Conhecimento - 2ª Fase	REQ2021.0144685	Prioritário	Planejamento	Marcelo Barroso Bernabé	AGO/19	DEZ/22
Projeto ATHOS	REQ2021.0143657/ SEI 20210618441	Prioritário	Execução	Claudio A Félix Pinto	JUN/21	TBD
Reestruturação do Portal TJERJ	REQ2021.0144529	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	JUL/21	DEZ/22



Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Fim Previsto
RPA e IA Inteligência Artificial/Pje - Plataforma de Medição	REQ2021.0144658/ SEI 20210649378 / SEI 20210675202 / SEI 20210674784	Estratégico	Execução	Humberto Vieira da Cruz	MAR/21	FEV/23
Servidor Elasticsearch - Indexação Jurisprudência e DJE	REQ2021.0144641/ PROT 20160159706	Prioritário	Homologação	Marcelo Barroso Bernabé	SET/18	FEV/22
SIDEJUD NACIONAL - Sistema de Depósitos Judiciais	REQ2021.0144667	Prioritário	Execução	Natalie Mussi Tavares e Marcelo Lettério dos Santos	JUL/21	TBD
SISPEJUD - Novo Sistema de Perícias	REQ2021.0144675	Prioritário	Homologação	Claudio Viana da Silva	JUN/20	ABR/22
Sistema de mandados de pagamento do Banco do Brasil -PJE	REQ2021.0144668	Estratégico	Execução	André do Amaral Gurgel	JUL/21	DEZ/22
Sistema GRP-THEMA da DGPCF	REQ2021.0143660	Prioritário	Homologação	Rodrigo Meireles Soares	DEZ/18	AGO/22
Substituição do SHS pelo SCOLWEB	REQ2021.0144686	Prioritário	Execução	Cleiver Carvalho Carneiro	NOV/14	MAI/22

### 3. Status atual dos projetos da GBTEC

PP XXXXX - Cyber Segurança: Foram finalizados os artefatos para a contratação pela DGTEC: ETP- Estudo Técnico Preliminar (Análise de Viabilidade da Contratação, de Estratégia da Contratação, Plano de Sustentação e Análise de Riscos), TR e Anexos. Os autos foram enviados, em 11/02/2022 à DGTEC/ASCON e ESPRO para análise/revisão quanto às alterações/questionamentos formulados pelo SERER. Aguardando a finalização da análise do TR e ETP.

PP XXXXX - Implementação/atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4: Projeto em fase de planejamento e elaboração dos ETPS, TR, TAP, PGP e pendente a validação do cronograma. Estão sendo realizadas reuniões quinzenais com Gestor Ivan, ESPRO e ASCON para continuidade nas definições do escopo e prazo. Ficou definido o modelo de contratação em função da mudança da adoção do ITIL 4 ao invés do ITIL 3. Encaminhada informação sobre a nova Portaria de Equipe de Planejamento da Contratação para equipe. A próxima reunião de controle será realizada em 10/03/2022.

### 4. Status atual dos projetos do DEINF

PE 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade): **SEI 2021-0625633** - Aquisição Solução Processamento Bancos de Dados Oracle - 2021 – Fase: Elaboração ETP's e comparação de valores. O projeto aguarda definição do Órgão Demandante pela solução escolhida. O tempo elevado na escolha da solução acarretou mudanças no cronograma de aquisição. **SEI 2020-0617549** - Aquisição de solução de IPS para segurança de perímetro de internet (2021). Fase: Contratado e instalado. Termo de encerramento. **SEI 2020-0602492** - Aquisição de Solução de Next Generation Firewall (2021). Fase: Já foi contratado. Entregue em 13/10/2021. Ainda não foi agendado a reunião inaugural. Foi solicitado a emissão de nova NEM. Aguardando o cancelamento dos empenhos e emissão dos novos empenhos. **SEI 2020-0695344** - Aquisição de Solução de Balanceamento de aplicação (2021). Fase: Contrato assinado e publicado. Constituída a equipe de fiscalização. Entregas dos equipamentos balanceadores foram realizadas dias 17/12 e 28/12. A instalação deverá ocorrer até a parada programada de fevereiro/2022. **SEI 2021-0616568** - Equipamentos para Backup (2022). Fase O processo se encontra na DGLOG-SECOM para novas pesquisas. Foi emitida a RM e os autos foram enviados à DGPCF para providências na esfera de sua competência.

PE 32408 - Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC (continuidade): **Storages:** Termo contratual nº 003/698/2021 assinado. A previsão de início da etapa de entrega e instalação era 03/01/2022, mas ainda se aguarda confirmação pelo DEINF do início desta atividade. **Serviço IAAS:** autos com ETP's. Estudo técnico e nova pesquisa preço, foram encaminhados ao DGCOL, para formalização da autorização de adesão via sistema informatizado CCGF. **Colocation:** minutas dos EPTs e TR encontram-se no DGCOL-DECAN para esclarecimento de dúvidas sobre a finalização dos ETP's, quanto à colocação de patrimônio do TJERJ em área privada.

## 5. Status atual dos projetos do DEATE

**PP 32073 - APP Escritório Virtual:** Os testes do APP para Android e IOS 1a instância estão sendo finalizados e o ambiente está pronto para o teste do piloto. Ainda com dois erros em ajustes pela MPS e EDS Judicial/ Zayat na 1a Instância. As intercorrências estão sendo corrigidas e sinalizadas por Sprint e pelo Teams por toda a equipe do projeto. Iniciado os testes em 21/02/2022 para 2a Instância, ainda sem planejamento do checklist. O APP será apresentado a Presidência no dia 09/03/22 e os usuários do piloto serão definidos.

**PE 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade): SEI 2020-0616028** - Compra de Microcomputadores (2021) Feito RP (Registro de Preços) para de 4.500 micros e 4.500 monitores. Já foram entregues até 10/01/2022 3800 microcomputadores e 3800 monitores. Resta a possibilidade de solicitar mais 700 micros e 700 monitores que foram solicitados para 2022. **SEI 2020-0616045** - Compra de Scanners (2021). Contrato assinado com a empresa Microsens para aquisição de 1.000 scanners de mesa e os lotes estão disponíveis para solicitação. Emitida NEM (Nota de Encomenda de Material) para 500 scanners. **SEI 2020-0618122** - Compra de impressoras (2021). Fase de Estudos. O processo foi retirado da pauta da reunião do CGTIC e encaminhado para GBTEC para definição da continuidade. **SEI 2020-0633803** - Aquisição de 400 Switches. Contratado e entregue em 09/09/2021. Fase: Instalação. Em 13/10/2021 foi iniciada a substituição dos switches. Continua em processo de instalação dos equipamentos. Já foram substituídos os equipamentos dos andares 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º da Lâmina II e CONAB, totalizando 162 switches instalados no final de 2021 em substituição aos switches modelo Nortel. O cronograma de instalação dos 238 switches restantes tem previsão de instalação a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022. Em fevereiro/22, foram instalados 3 switches em Porciúncula e 2 em Rio Claro. **SEI 2022-06014242** - Nova Aquisição de 600 Switches (para 2022): Pesquisa de mercado. TR e ETP finalizados. Foi aberto processo SEI. O processo foi recebido no ESPRO e está aguardando o agendamento da data para a reunião do CGTIC para aprovação.

**PE 32957 - Digitalização de processos físicos (continuidade): Fase atual:** As Centrais de Digitalização/Indexação/Virtualização estão com as atividades um pouco atrasadas, mas dentro da previsão de desvio. A licitação empresa Microsens está em fase de assinatura do contrato SEI 20210640017 e posterior entrega dos equipamentos. Em fevereiro/2022 o número de processos físicos, pendentes de digitalização, está com 16% do total de processos de 1a instância do TJERJ. O projeto teve reavaliação do cronograma e PGP para melhor controle e detalhamento do projeto à metodologia DEGEP, com identificação mais realista do percentual de conclusão do projeto que está com 30% concluído.

**PP 31480 - DNA WEB: SEI 2020-0687459** – Projeto aguardando aprovação da definição do cronograma dos Projetos Estratégicos do TJERJ para o ano de 2022, a fim de que seja possível o desenvolvimento de plataforma dentro do fluxo do Pje, competência família. Projeto em fase de levantamento e detalhamento pela área de negócios DEATE/DICAN. Apresentado o Canvas do projeto, modelo de negócio AS IS e TO BE ao PO para aprovação.

**PP - XXXXX - Implantação do RDC-Arg. no TJRJ:** No dia 16/02/22 através do chat do GT-RDC-arg (Portaria 2349/2021) foram apresentadas soluções para instalação do software livre. Em reunião de planejamento dia 16/02/22 foi discutido a forma do uso dos sistemas Archvemática e Atom e se serão incluídos no projeto os arquivos do sistema SEI.

[PE – XXXXX - Justiça 4.0 - Datajud \(Pje / Legado\) – 2022:](#) Continuidade do projeto DATAJUD 2021 com melhorias para e envio das informações conforme determinação CNJ. Desenvolvimento pela EDS-JUDICIAL com requisições abertas para o levantamento das tabelas utilizadas no DCP e eJUD que não estejam na tabela SGT/CNJ: REQ2022.0017309 (PJE); REQ2022.0020997 – sistema DCP (EDS); REQ2022.0021008 – sistema EJUD (MPS). Itens atendidos: Definição de data de corte de envio de CNJ, envio de baixados de Jan/2020 a Dez/2021 e envio de processos de tramitação de 31/12/2021.

[PP – XXXXX – NatJus – Sistema SISNAT:](#) Projeto aprovado pelo CGTIC para início do desenvolvimento a partir do segundo semestre de 2022. Estão sendo realizadas reuniões com o PO, área de negócios DICAN, DEATE e ESPRO mensalmente para elaboração da documentação inicial. O ESPRO encaminhou ao gestor Fernando o cronograma contemplando as atividades da área de Negócios para validação. No aguardo da próxima reunião a ser agendada para prosseguimento das tarefas planejadas, bem como para demais providências a serem tomadas.

[PP 32951 - Nome Social:](#) **Sem alteração de Status** devido a priorização de outros projetos pela administração. Aguardando retorno do gestor Fernando sobre as 28 requisições referentes aos desenvolvimentos nos sistemas Portal, eJUD e DCP, que estão pendentes de desenvolvimento ou disponibilização em produção pela MPS e EDS Judicial para encerramento do projeto.

[PP 32328– Novo Portal Advogados/Partes:](#) O Portal foi disponibilizado em produção em agosto/2021 e está estabilizado aguardando transição do legado pela administração. Novas demandas foram inseridas para desenvolvimento que foram verificadas de grande necessidade com a entrada em produção para todos os usuários. Novo visualizador de processos concluído.

[PP – XXXXX – Novo Sigilo – 1ª Instância:](#) Toda documentação relacionada à área de negócios DEATE/DICAN foi entregue a EDS Judicial para o desenvolvimento da alteração de sigilo no portal, referente a 1a fase do projeto. Esta fase está com 55% concluída e tem data final prevista para 07/03/2022. Após esta entrega será iniciado o planejamento referente as mudanças solicitadas pelo CNJ.

[PP 32950 - Novo Sistema de Cálculos Judiciais: SEI 2020-0645134.](#) Projeto sendo desenvolvido pelo SCRUM, o que impacta uma previsão estimada de término, mas a previsão inicial é dezembro/2022. Aguardando recebimento e validação dos cálculos judiciais pelo PO para a EDS Judicial iniciar fase de desenvolvimento do back end do Módulo Cível. Os documentos da área de negócios DEATE/DICAN e o cronograma estão aguardando validação pela equipe DGTEC para envio ao PO. Uma nova estratégia da DGTEC será levada para aprovação com o levantamento de requisitos dos módulos Fazendário e Previdenciário e o desenvolvimento do front end destes módulos pela EDS Judicial para que o projeto não fique paralisado aguardando a validação dos cálculos judiciais cíveis pelo PO.

[PP – XXXXX - Parcelamento da GRERJ – Edital:](#) Projeto em fase de elaboração da documentação pela área de negócios DEATE/DICAN para início do desenvolvimento. Devido a mudança na fábrica de desenvolvimento da Spassu para NTL tecnologia o projeto não foi priorizado no período.

[PP 32949 - SISPEJUD – Novo Sistema de Perícias: REQ2020.0115308](#) - Projeto dividido em 3 fases. Aguardando definição da equipe do projeto para implantação. **1ª Fase:** Os testes de validação estão sendo realizados pela área de negócios DEATE/DICAN. Itens da próxima Sprint 16/03/2022: Correção de erros reportados, Verificar a normalização dos dados tabela profissão / especialidade, Reunião com a PUC sobre API Peritos; **2ª Fase :** Funções do Pagamento (registro em lote) – disponibilizado em HML para testes; Pessoa Jurídica – aguardando publicação do ato ; Tela externa para perito se cadastrar e fazer solicitações – a definir os requisitos; Demais Relatórios - a definir os requisitos; Integração com PJE; Modulo Configuração – a definir os requisitos; **3ª Fase:** Integração com DGPCF - a definir os requisitos.



[PP 32404 -Sistema GRP-THEMA da DGPCF](#): Projeto dividido em 4 fases. **Fase 1 e 2**: Em Produção; **Fase 3**: Em fase de homologação pela DGPCF. Previsão de conclusão da homologação no dia 28/03/2022. Em execução os testes de remessa, retorno dos arquivos do Bradesco para o PAGFOR e o MULTPAG; **Fase 4**: Deadline 29/07/2022.

## 6. Status atual dos projetos do DESIS

[PP XXXXX - Acessibilidade Portal](#): **SEI 2021-0660622**. Projeto em fase inicial de planejamento aguardando definição de faturamento da Vertigo para atividades relacionadas ao projeto e aguardando aprovação de contratação da ferramenta em libras. Reunião a ser agendada para março/2022 com PO e DGTEC referente à elaboração de material informativo DGCOM sobre os procedimentos a serem adotados pelas diretorias na inserção de matérias utilizando regras do eMAG.

[PP 32822 – App do GabineteWeb](#): O APP na plataforma IOS ainda não disponível para testes. O APP para Android foi disponibilizado no ambiente de Homologação e os testes foram iniciados. Poucos erros estão sendo encontrados para 1ª Instância. **Pendente**: Erro de POP UP corrigido, porém outros erros foram reportados que estão em correção pela Vertigo e liberação do App para IOS. **Próximos passos**: correção dos erros reportados, liberação do link para o aplicativo IOS, testes para o IOS, workshop sobre o App para o suporte e usuários piloto e Integração do App com 2ª instância.

[PP XXXXX - Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau \(eJUD\)](#): Novo Projeto no Portfólio. Reunião de Kick off do projeto realizada em 24/02/2022, para alinhamento das primeiras atividades e entendimento do escopo e prazo do projeto.

[PP 31657 – Certificação Custas \(continuidade\)](#): Projeto desenvolvido pela metodologia SCRUM entregue por Sprints. Atividades Concluídas Sprint 59- **ARRECIINTEGRA**: Desenvolvimento para integração com o serviço IDSERVERJUS; Levantamento dos fluxos das Certidões de Débitos; **GRERJ Eletrônica**: Atualização tecnológica do sistema - Quarta parte; Alteração na assinatura do serviço de gravação na árvore do processo - SEEU; Levantamento para criação da GRERJ Remanescente no Portal.: Para iniciar as atividades de implantação do ARRECIINTEGRA WEB está sendo aguardado as definições relacionadas às novas regras sobre custas judiciais aprovadas pela ALERJ em 07/12/2021. **SMR**: No dia 05/11/2021 foi disponibilizado para o Sr. Jobson Nascimento a nova versão, onde estão sendo realizadas as alterações dos módulos (Integração com o sistema Portaria de Custas). Porém em reunião do dia 13/12, foi informado que devido à mudança nas regras de custas ( aprovadas pela ALERJ em 07/12/2021), não haverá tempo de readequar todos os modelos.

[PP 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis e Executivos Fiscais](#): Projeto sendo desenvolvido pela EDS Judicial por metodologia SCRUM. Entrega 2 - Elaboração dos históricos do usuário foi concluída; Entrega 3 - Aprovação dos históricos do usuário, tarefa 3.1 - Aprovar histórico do usuário para identificação de processos dos Juizados Especiais Cíveis na base de dados do sistema ARQGER com status "amostragem" foi iniciada.

[PP 31924 – e-Social: SEI 2021-0608628](#). Projeto desenvolvido pelo método Agile Scrum, pela SPASSU PESSOAL com 15% concluído. Observação: Na medição do projeto anteriormente estava em 21%, mas retornou para 15% devido a dois eventos que estavam dados como concluídos e voltaram para esteira (EMERJ). Sprint 13 em desenvolvimento para entrega em março/2022.

[PP 32047 – Gabinete WEB: 1ª Instância](#): Versão em produção 3.3.0 pela EDS Judicial. Itens faltantes: 8 cards do Dashboard - melhoria na visualização (adicionar gráficos); Fila de Assinatura - análise melhoria de desempenho; Adicionar validação para Assinatura de Mandado de Pagamento; Melhoria no Menu lateral ; Análise Assinatura de Mandado de Pagamento; Revisar relatório de processos de cumprimento de sentença/execução; Nova estrutura para tela de Quantidade de Processo por Local Virtual; Melhorias no Editor de Texto; Novo sigilo; Integração ao PDPJ do CNJ. **2ª instância**: Reunião mensal de alinhamento do projeto com a MPS. Ainda faltam 9 requisições para finalizar a 2ª fase do projeto: 2 requisições aguardando aprovação da Lista de Requisitos pela DGJUR; 1 requisição aguardando aprovação da Contagem de Pontos pela administração; 4 requisições prevista para disponibilizar em produção no dia 09/03/2022 e 2 requisições prevista para disponibilizar em produção no dia 05/05/2022.

[PP 30280 – Implementação do novo sistema GPES](#): Projeto sendo desenvolvido pela SPASSU PESSOAL com metodologia SCRUM. Entregas no período: **1a Frente** – Servidores - Módulos: Cadastro de Servidores e Lotação (movimentação); **2a Frente** – Magistrados - Módulos. Cadastro de Magistrados, Licença Especial e Cadastro de Conversão de Plantão em Pecúnia. Integração de Pecúnia de férias com a folha de pagamento; **3a Frente** - Auxiliares de Justiça. UnivWeb e Conciliador. **4a Frente** - Benefícios - Módulos: Auxílio Pré-escolar - Melhorias. Auxílio Creche Melhorias. Auxílio Alimentação/Refeição - Melhorias ; **Integrações GPESxFolha** - Integração do cadastro de servidores com a folha.

[PP XXXXX - Integração MNI 2.2.2 - STF](#): Os testes foram paralisados devido a nova correção solicitada pelo usuário e será disponibilizado um build atualizado para os testes de homologação até o dia 04/03/2022. O reinício dos testes de homologação ocorrerá no dia 07/03/2022. Fase 1 entregue - REQ2021.0193923.

[PP XXXXX – Integração MNI 3.0 – STJ](#): Aguardando aprovação da Lista de requisitos pelo DESIS e PO - REQ2021.0040251. Após será encaminhada para aprovação de custo pela administração e posterior início do desenvolvimento pela MPS.

[PP 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADM](#): Projeto antigo e pouco documentando que passou por diversas mudanças de escopo. Este projeto tem 3 entregas para finalizar: 1) Migração do sistema PROT para EPROT: está 50% concluído. Função Movimento por lote em produção. A migração das caixas em andamento, sem previsão de término; 2) Migração do SISTEMA CPI para Controle de inquéritos da CGJ: Em andamento Modelagem e migração dados. Prazo final era janeiro/2022. Está aguardando o término do sistema EPROT; 3) Serviço de WEBLINKS: De 24 serviços iniciais restam em andamento: WEBLINKS 16 - Endereço e Telefone, fase de preparo para produção. WEBLINK 26 – Edital – SPRINT 33 terminada 16/02/22. WEB LINKS 17 a 19 - Universitários: (levantamento de informações SPRINT 34).

[PP 32403 - Novo Sistema de Cobrança](#): Projeto sendo desenvolvido por Sprints, metodologia SCRUM. Atividades Concluídas Sprint 63 - 07/02/2022 a 18/02/2022: Remoção do Commons no projeto, parte 8; Realizar checklist e ajustes nas funcionalidades implementadas no Angular 11 (débitos técnicos) – parte 10.

[PE 32407 - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos \(Implantação do Novo Sistema de Gestão de Acesso \(IDServerJus\)](#): Projeto sendo desenvolvido pela metodologia SCRUM por Sprints. Até o momento foram entregues 16 sprints pela Spassu Financeiro, mas devido a mudança da empresa para a NTL Tecnologia não houve mudanças no período. O projeto está com 69% concluído na base de homologação. Data



prevista de encerramento do Projeto: 30/04/2022. A fábrica está atuando no desenvolvimento de autenticação nova e o mesmo está praticamente finalizado. Faltam os testes e a questão do certificado digital, além de algum refinamento a ser alinhado em próxima reunião de controle do projeto.

PP XXXXX - Novos Portais Corporativos em Desenvolvimento: Reuniões Status Report sendo realizadas semanalmente com a empresa desenvolvedora Vertigo, ESPRO, Gestor e DEATE. Entregues os portais: Portal HotSite Turismo, Portal da Governança, Portal de Precatórios. Os portais NUCOOP, Agendamento de Audiências e Jovem Aprendiz foram disponibilizados em produção, mas não foram mais priorizados em novas implementações pelo demandante. O Portal CODAT aguarda finalização da comunicação dos Registrys pela DGTEC. Ainda em desenvolvimento: Portal NUGEP - REQ2021.0058156 disponibilizada em produção pela MPS, mas aguardando a disponibilização dos três novos links (IRDR, IAC e GR) no menu TJERJ pela Vertigo; Portal das Turmas Recursais - em finalização a homologação e a entrega do portal em produção pela Vertigo. A entrega da MPS ainda está em fase de aprovação da Lista de Requisitos e posterior aprovação do custo pela administração para iniciar o desenvolvimento. O cronograma e o CANVAS elaborados para os portais ainda em desenvolvimento aguardam aprovação pelo Gestor Marcelo.

PP 32762 – Portal do Conhecimento - 2ª Fase: Projeto em fase inicial de planejamento aguardando o escopo que será encaminhado pela DGCOT, conforme reunião 23/02/2022, para início do desenvolvimento pela Vertigo

PP XXXXX - Projeto ATHOS: REQ2021.0209353 - eJUD - Integração NUGEP com Sistema IA /ATHOS SÓCRATES STJ : A equipe de desenvolvimento está em fase final de aprendizado da ferramenta junto ao STJ. Aguardando aprovação da Lista de Requisitos pelo PO. Após será encaminhada para aprovação de custo pela administração e posterior início do desenvolvimento pela MPS.

PP XXXXX - Reestruturação do Portal TJERJ: Projeto dividido em 2 fases (Intranet e internet). A fase 1 - Intranet está em fase de implementação da 3ª entrega e de algumas funcionalidades, com 66% concluída. Reuniões sendo realizadas semanalmente com a empresa desenvolvedora Vertigo. A fase 2- Internet ainda está em fase de planejamento e elaboração do cronograma.

PP 32330 - Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE: Projeto está em homologação pela DGTEC e DGCOT com previsão de conclusão para março/2022.

PP 30229 – Substituição do SHS pelo SCOLWEB: Projeto realizado de forma incremental em sprints quinzenais pela metodologia SCRUM pela EDS Logística. O gestor Cleiver atualizou o documento Canvas do projeto proporcionando melhor visibilidade ao gerenciamento do projeto ao ESPRO, que tem previsão de encerramento para 31/03/2022. Novas funcionalidades serão desenvolvidas apenas após a conclusão desse projeto, sendo planejadas e priorizadas conforme solicitação dos usuários.

## 7. Status atual dos projetos da ASPJE

PE XXXXX - Assistente Virtual do Pje: SEI 2020658834. Não houve reuniões de controle no período, mas o Teams está sendo utilizado para controle do projeto. O Gestor André/ ASPJE solicitou gestão nas tarefas do DEATE para preparar o conteúdo do Chatbot e posterior a entrega do projeto. Foram solicitadas planilhas de e-mails com nomes dos servidores para endereçar ao DIAPA. Também foi solicitado a confecção de banner/carrossel para divulgação da IETE na INTRANET do portal do TJRJ.

PP 30220 - Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI – fase 2: Primeira fase do projeto finalizada e entregue pela TOCATTO. Iniciada a Fase 2 em 17/02/2022 com previsão final em 31/012/2022. As novas entregas desta fase estão em avaliação junto aos grupos de usuários e devem abranger inicialmente os indicadores do PJE – Criminal , novos indicadores do DEIGE, meta 1 (versão 2), Processometro, etc. Ainda não foram definidas as novas etapas e datas que permita gerar um novo cronograma.

PE XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Infância e Juventude: Projeto aguardando a entrega 2 pela EDS Judicial e homologação pelo MP para continuidade. Conforme o Aviso TJ nº 117/2021, publicado em 08/10/2021, pelo prazo de 90 dias a implantação foi suspensa com retorno a partir de Janeiro/2022, mas se aguarda a finalização dos testes que estão sendo realizados pelo MP para esta implantação final. **Entrega 1:** 100% realizado (corresponde a 60% do cronograma); **Entrega 2:** Não realizado. Previsão inicial para término: 05/10/2021 (corresponde a 15% do cronograma) - Não houve evolução no cronograma para entrega 2, que corresponde ao Levantamento e Desenvolvimento de Melhorias; **Entrega 3:** Não realizado. Previsão inicial para término: 20/12/2021 (corresponde a 25% do cronograma). Implantação da fase final - maiores serventias Infância e Juventude (Capital, Madureira e Santa Cruz).

PE XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Cível: Piloto disponibilizado em produção desde 27/10/2021 sendo monitorado pela equipe do projeto. Publicado Ato Normativo Conjunto 04/2022 sobre a continuidade de implantação incluindo as serventias com competência cível e acidente de trabalho, com previsão final até 11/07/2022. Existem tarefas do cronograma que ainda não foram finalizadas com previsão de término até dezembro/ 2022 . Entrega atual pendente: Integração Banco do Brasil. As reuniões de controle do projeto estão sendo realizadas quinzenalmente onde são analisados os erros e as datas de correção pela EDS Judicial . Última reunião realizada em 26/01/2022 com as informações sobre problemas de integração do Banco do Brasil, bem como do treinamento aplicado em 3 comarcas a que se refere ao treinamento básico. Próxima reunião de controle será realizada em 10/03/2022.

PE – XXXXX- Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Criminal: O Projeto está com 39% execução em ambiente de homologação. A EDS Judicial disponibilizou um ambiente de homologação versão do TJRJ (2.1.8) e está efetuando ajustes necessários, incluindo os ajustes no serviço BNMP. A equipe de integração com PJE – Criminal está trabalhando para homologar ao serviço MNI 2.2.3 nativos do PJE-Criminal. A EDS Judicial informou que 27% dos fluxos já estão elaborados. Definida uma nova data para o piloto em 16/05/2022. Os itens 1 e 8 do cronograma são as maiores preocupações para as datas definidas e podem impactar o projeto.

[PE XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa:](#) Projeto desenvolvido por vários tribunais em conjunto com o TJERJ. Sem atualização pelo GP sobre as entregas realizadas no período. **Atividades em Andamento:** Fluxos Integrados/Ajustes, configuração e disponibilização dos fluxos no ambiente do CNJ; Alterações do Portal do Usuário Externo e no MNI para inclusão dos dados da CDA na distribuição/Novos testes.

[PE XXXXX - Integração com a PDPJ e o CODEX:](#) Novo projeto no Portfólio do ESPRO. A reunião de Kick off está marcada para final de março/2022 a fim de alinhar prazo, escopo e definir atividades.

[PE – XXXXX - Integração PJE x SEEU:](#) Subprojeto do projeto PJE Criminal e os controles de tempos estão sendo feitos através do cronograma do PJE – Criminal. A equipe está trabalhando para atender a uma integração do PJE com SEEU. (Serviço da VEP): 1- Via PROJUDI: está sendo criada uma interface no serviço PROJUDI para que as serventias possam informar os dados das cartas de sentenças; 2 - Via SEEU: está sendo resgatada uma integração já existente entre o PJE criminal e o SEEU (que foi descontinuada por conta de alguns erros). Deverá ser objeto de implementação a solução que estiver disponível à época de implantação do piloto do criminal.

[PE 32955 Justiça 4.0 - Domicílio Eletrônico:](#) No dia 22/02/2022 Painel (Portal de serviços) foi realizada a única reunião do Domicílio Eletrônico sobre o ponto de controle na definição de requisitos. Foi apresentado ao Dr. Adriano/CNJ a configuração no JS para chamada ao PJeOffice com modo teste. Após a Entrega 1 ser finalizada as outras entregas do cronograma não serão realizadas pelo TJERJ, conforme determinado em reunião de alinhamento do projeto. O projeto desta forma será encerrado no portfólio.

[PE 32956 - Justiça 4.0 - Painel do Usuário Externo:](#) No dia 22/02/2022 Painel (Portal de serviços) foi realizada a única reunião do Domicílio Eletrônico sobre o ponto de controle na definição de requisitos. Foi apresentado ao Dr. Adriano/CNJ a configuração no JS para chamada ao PJeOffice com modo teste.

[PE XXXXX - Migração de dados DCP x Pje:](#) Projeto foi suspenso temporariamente pelo gestor, pois recurso da EDS Judicial para este desenvolvimento está alocado atualmente na entrega do projeto de implantação do Cível. Após a entrega a situação deste projeto será reavaliada. Planejado/Realizado: Criação Documento de Regras de Migração; Levantamento das tabelas do DCP; Levantamento das tabelas do Pje; Levantamento papéis e personagens; Identificação de schemas das Tabelas. Fase Atual: Estudo da previsão migração completa JEC; Estudo de tempo de migração de um processo (estudo para levantamento do número de processos a serem migrados do DCP para Pje e cálculo do tempo de migração). Foi informado pelo Gestor André que projeto de migração do DCP x Pje será reavaliado ao ser retomado. Será agendada reunião de Planning para combinar as próximas entregas desse projeto a partir de março/2022.

[PE 32959 - RPA e Inteligência Artificial/PJE:](#) O DOD (Documento Oficial de Demanda) do SEI 2022-06010686 foi aprovado pela CGTIC e a DGTEC liberou os estudos para aquisição da máquina para o aprendizado de Inteligência Artificial. O convênio Light/PUC e TJRJ, 2021 0674784 foi assinado e enviado para acompanhamento na ASPJE. O novo Convênio, SEI 2022-06018783, versa sobre o acréscimo de mais 03 meses no cronograma para estudo de máquina. No dia 17/02/22 houve a reunião Técnica Semanal IA: PUC-TJRJ onde foi solicitado o acesso ao GIT do TJRJ. No dia 18/02/22 houve a reunião sobre os parâmetros da avaliação técnica simplificada (perícia) - Projeto PUC. No dia 21/02/22 aconteceu a reunião sobre a minuta do Plano de Trabalho do novo convênio PUC e TJRJ (SEI 2022-06018783). No dia 24/02/22 houve a Reunião Técnica Semanal IA: PUC-TJRJ onde foi solicitado a apresentação inicial do projeto ODR PUC para a Presidência do TJRJ.



[PP XXXXX - SIDEJUD NACIONAL - Sistema de Depósitos Judiciais](#): Projeto sendo desenvolvido pela equipe técnica do TJ de Minas Gerais com outros tribunais, conforme padrão CNJ, com termo de cooperação assinado em março/21 pelo TJERJ, com metodologia SCRUM. A Sra. Marluce (TJMG) solicitou paralisar a parte do TJRJ por conta de um alinhamento com a empresa contratada pelo TJMG para fazer a integração de front com o back end.

[PE XXXXX - Sistema de mandados de pagamento do Banco do Brasil -PJE](#): Projeto em fase de execução e testes. Atividades em Andamento pelo DEINF e EDS Judicial: Instalar novo Tomcat; Instalar nova versão do SISCONDJ e Teste Integração com o Banco do Brasil. Foi necessário trocar o analista do projeto que está remodelando a API e por isto serão necessárias 2 sprints para concluir o desenvolvimento. Previsão de término 15/03/2022.
